

# DOSSIER TECHNIQUE

## COUPE PREVISIONNELLE

Entreprise:	RUCKEBUSCH
Client:	SCEA DE L'HERBIERE 42 Grande Rue 27150 LE THIL EN VEXIN
Maître d'oeuvre:	SCEA DE L'HERBIERE 42 Grande Rue 27150 LE THIL EN VEXIN
Exploitant:	SCEA DE L'HERBIERE 42 Grande Rue 27150 LE THIL EN VEXIN

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :**

27150 LE THIL EN VEXIN

<b><u>Coordonnées :</u></b>	<b>Longitude</b>	595 542	<b>Latitude</b>	6 913 344	<b><u>Altitude :</u></b>	106.00 m
	<b>Zone</b>	Lambert-93 métrique				

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 04/10/2021

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 15/10/2021

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 12.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### COUPE PREVISIONNELLE

**Client:** SCEA DE L'HERBIERE

**Maître d'oeuvre:** SCEA DE L'HERBIERE

**Lieu de l'ouvrage :**

27150 LE THIL EN VEXIN

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.00	Limons
4.00	60.00	Craie

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	60.00	19"5/8	498.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	15"3/4	400.00	10.50	1	P.v.c.	Tube-plein		
12.00	60.00	15"3/4	400.00	10.50	1	P.v.c.	Crepine fentes	3.00	12

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	15"3/4	400.00	Ciment	Clk	Gravitaire			

# COUPE PREVISIONNELLE

Client :

SCEA DE L'HERBIERE

Maitre d'oeuvre :

SCEA DE L'HERBIERE

Localisation de l'ouvrage :

27150 LE THIL EN VEXIN

Travaux réalisés :

du : 04/10/2021 au : 15/10/2021

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

595 542

Latitude (Y):

6 913 344


Altitude sol (Z):

+106.000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

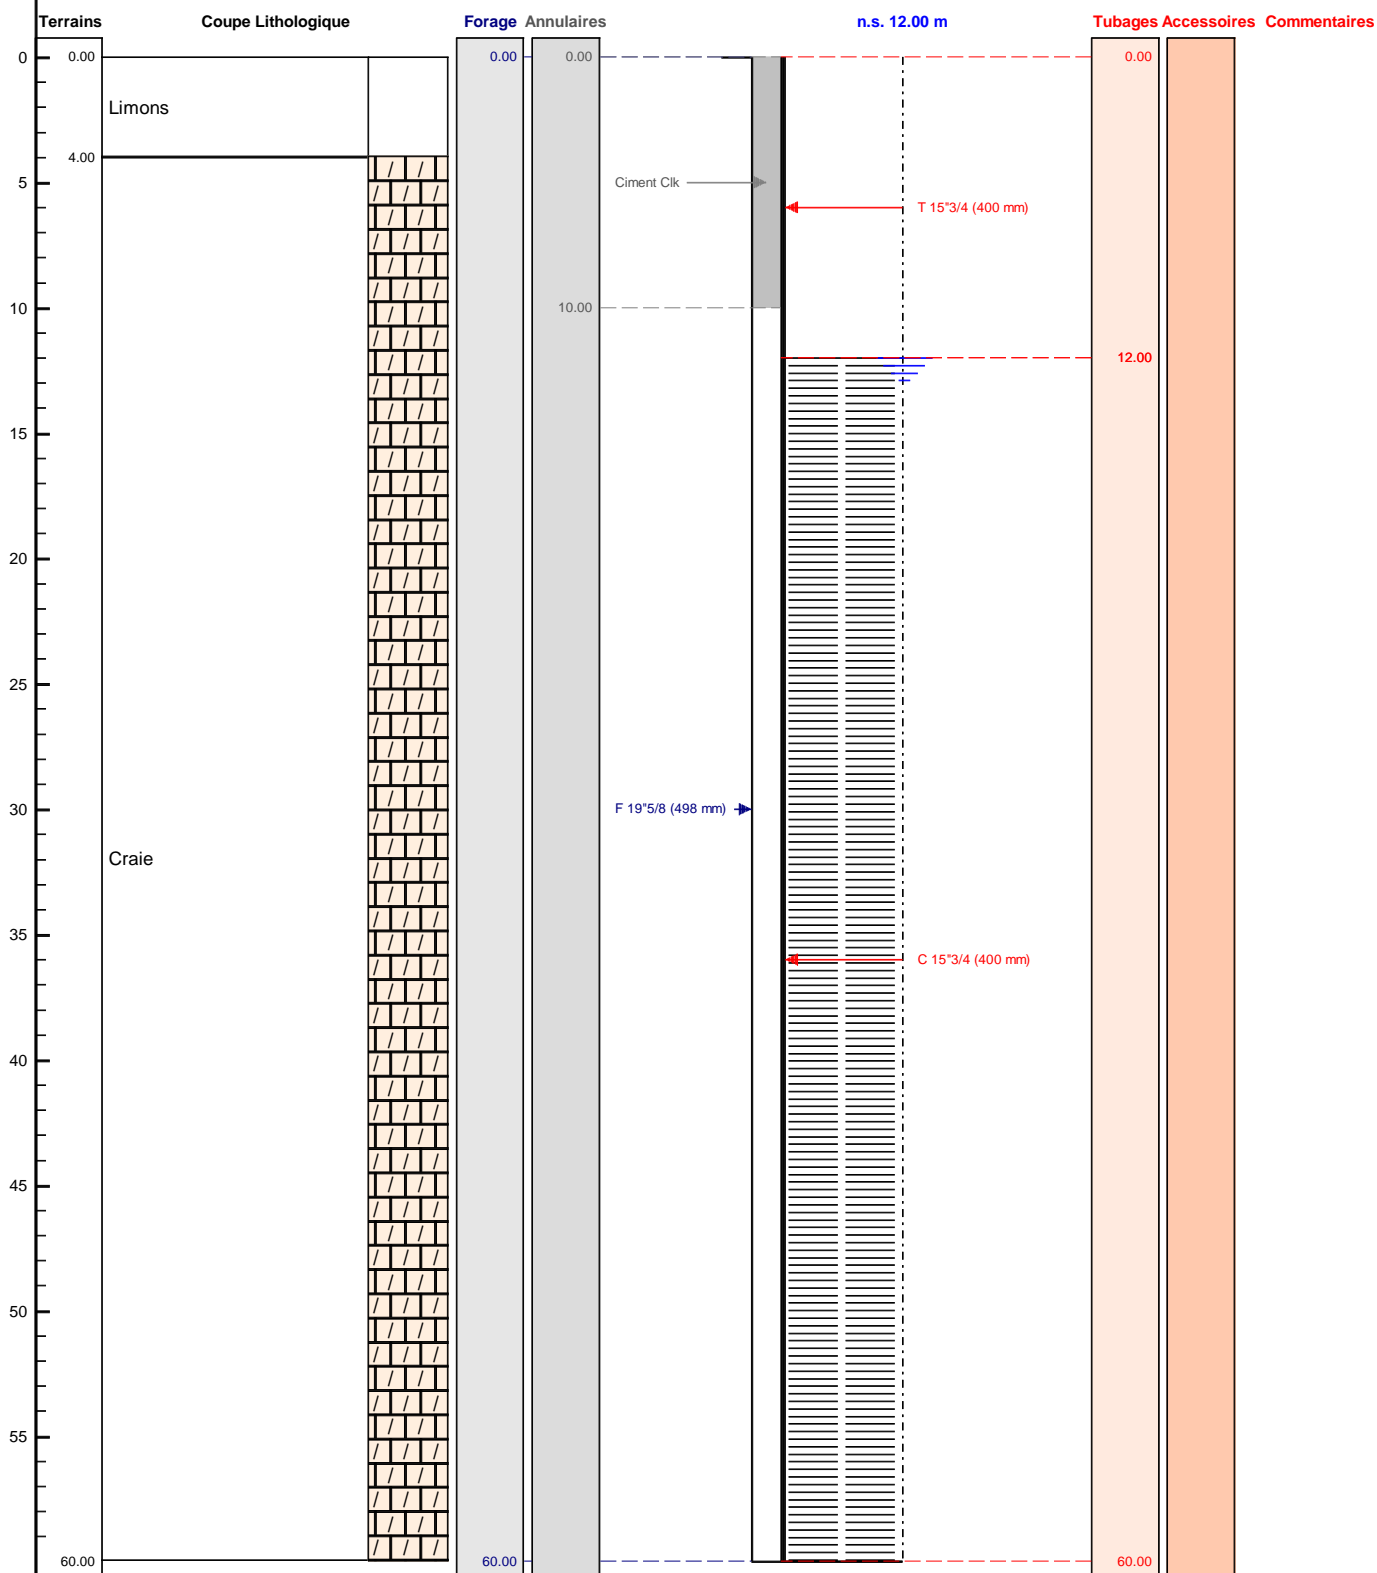

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
