

Annexes

Document n°1 : Implantation forage

Document n°2 : Extrait du plan cadastral parcelle ZD 40 de CALIGNY (61100)



Document n°3 : Carte géologique du secteur de CALIGNY(61100)

Document n°4 : Fiche masse d'eau n° FRHG502

Document n°5 : Coupe forage prévisionnelle

EARL DE LA LONDE, la Londe, 61100 CALIGNY – Projet de forage


1. Implantation projet de forage

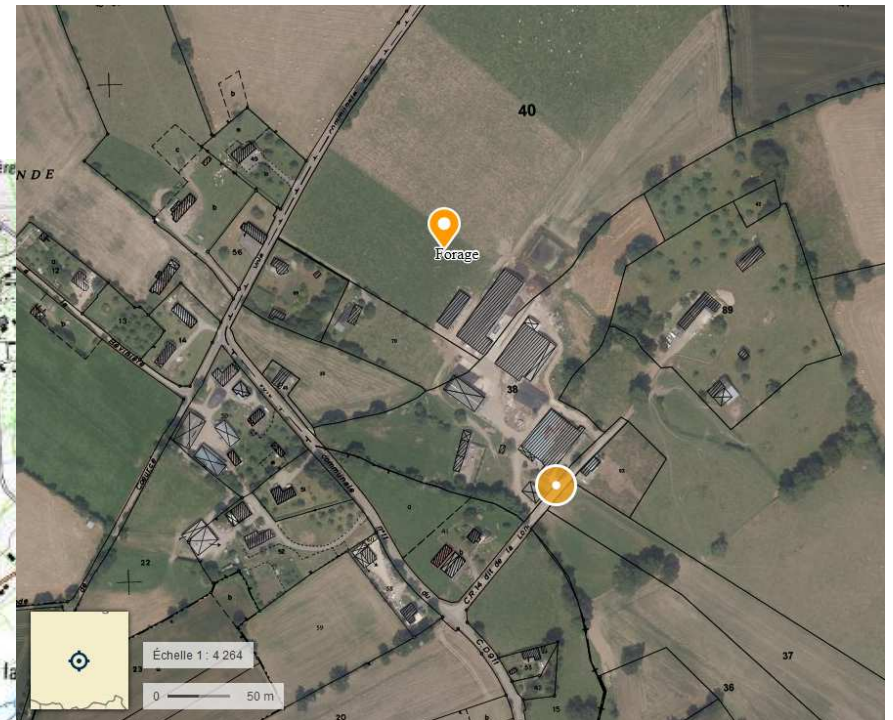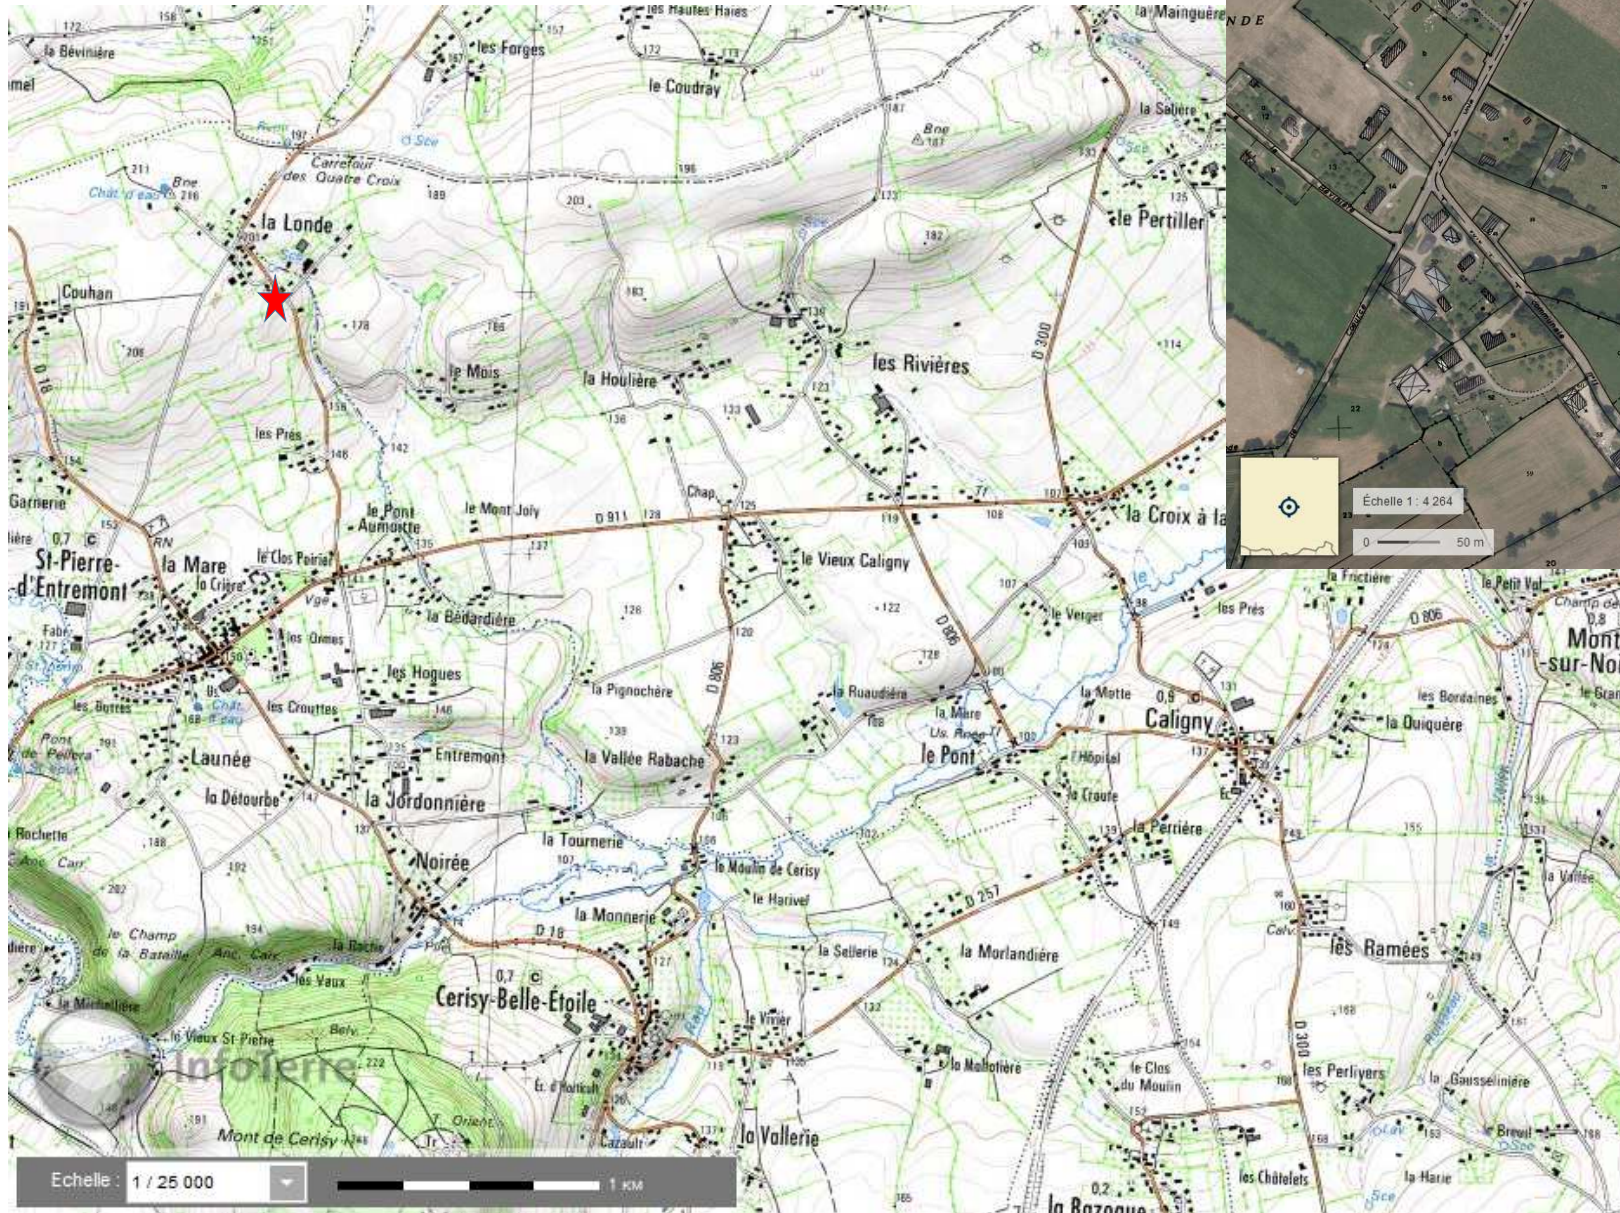

2. AEP le plus proche à 4 km



3. Extrait cadastral

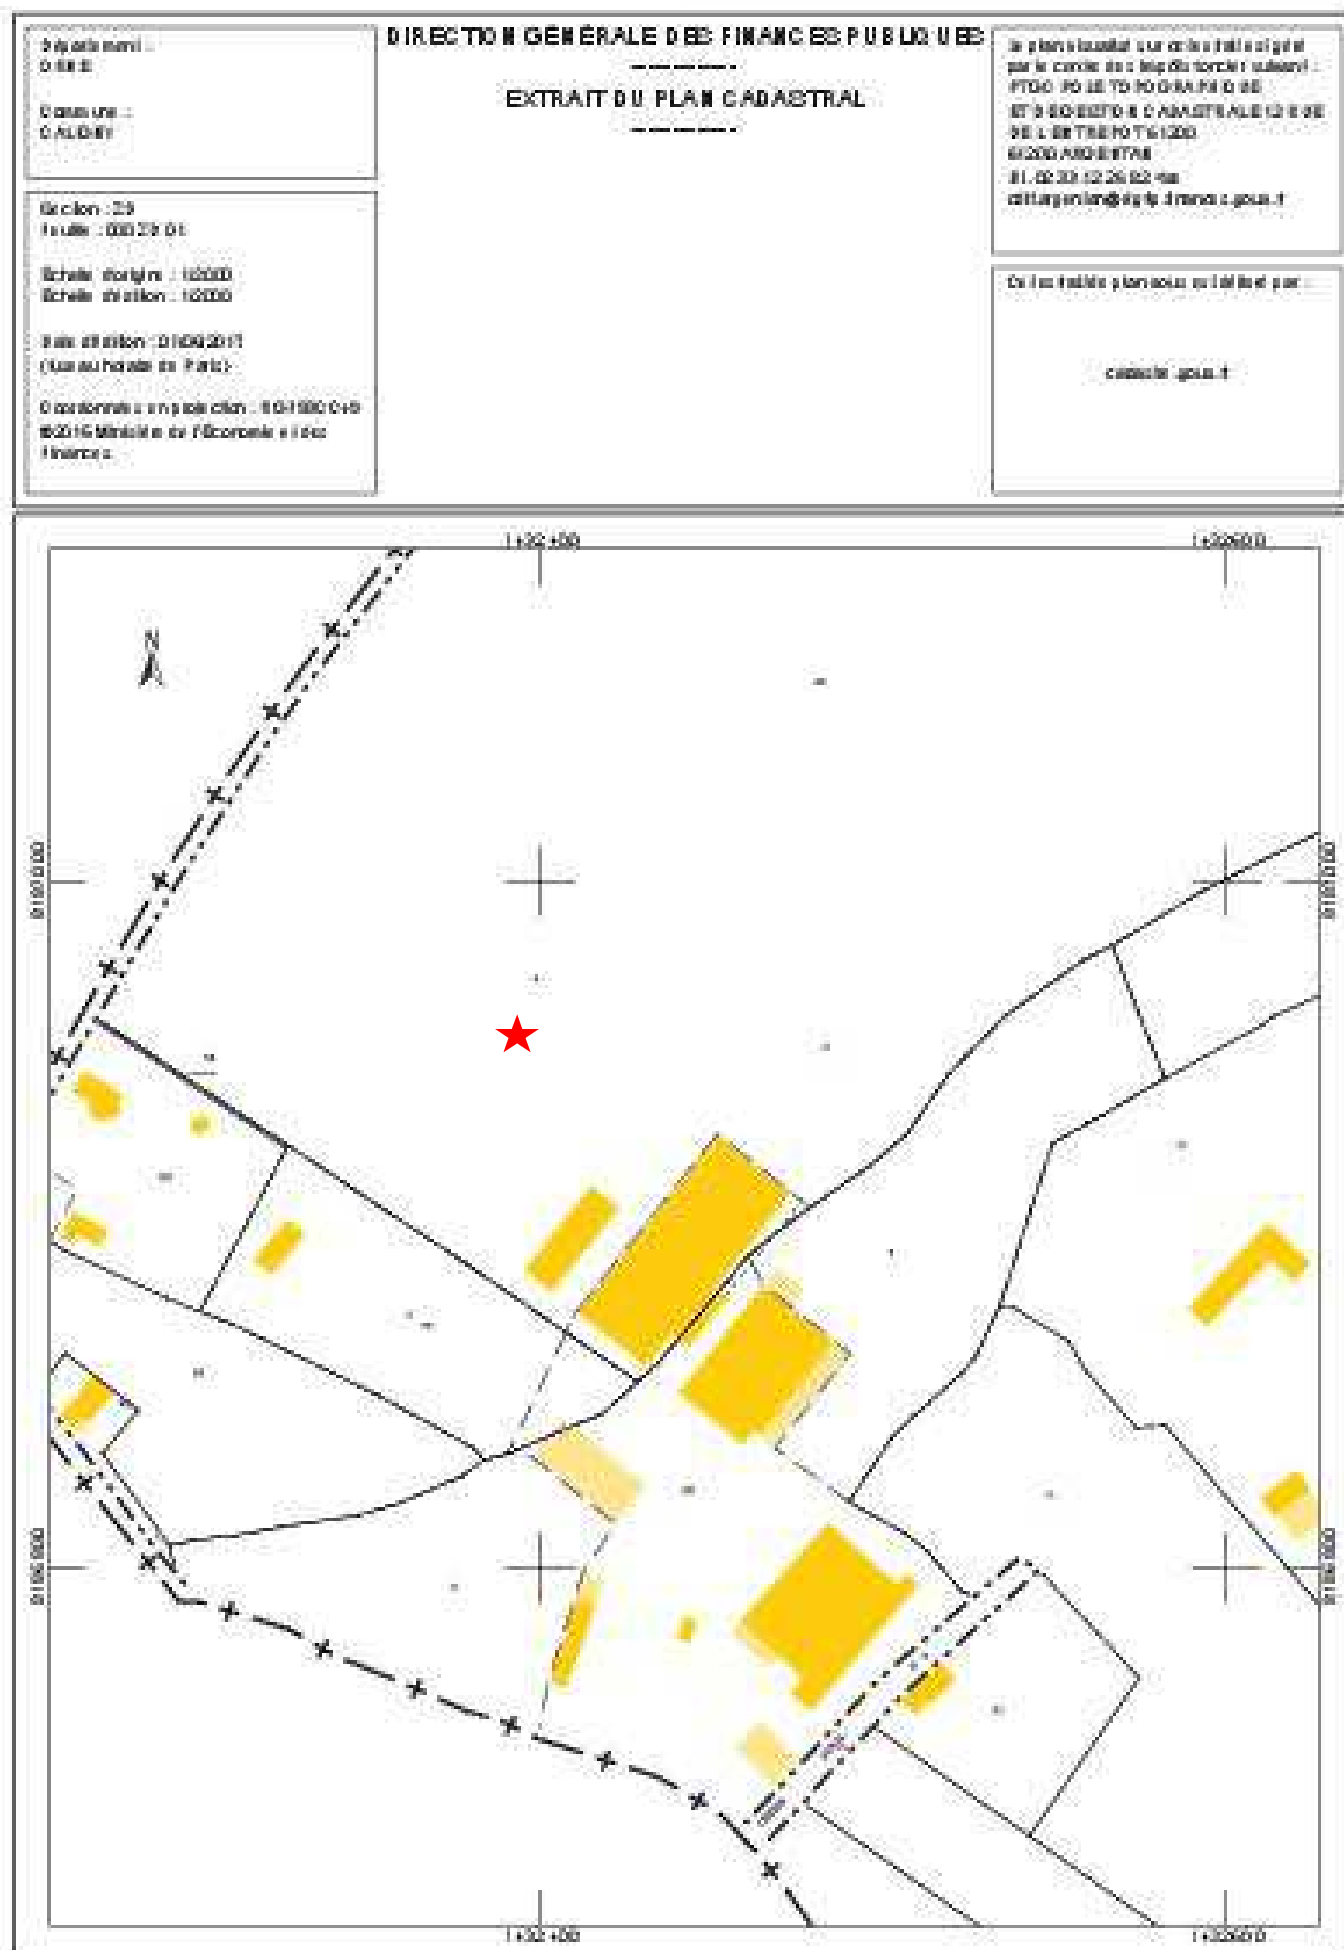

4. Coupe forage prévisionnelle

GTR FORAGES

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	EARL DE LA LONDE
Maître d'oeuvre:	EFFITERR
Lieu de l'ouvrage :	La londe
	61100 CALIGNY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	80.00	Schistes

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	80.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	35.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
35.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
45.00	70.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
70.00	80.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				
10.00	80.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :

1\1

du : 19/07/2017 au : 19/07/2017

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 2 étendu métrique

Longitude (X): 380 934

Latitude (Y): 2 429 316

Altitude sol (Z): +196,000 m

Client :

EARL DE LA LONDE

Maitre d'oeuvre :

EFFITERR

Localisation de l'ouvrage :


La londe

61100 CALIGNY

Echelle : 1/402

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

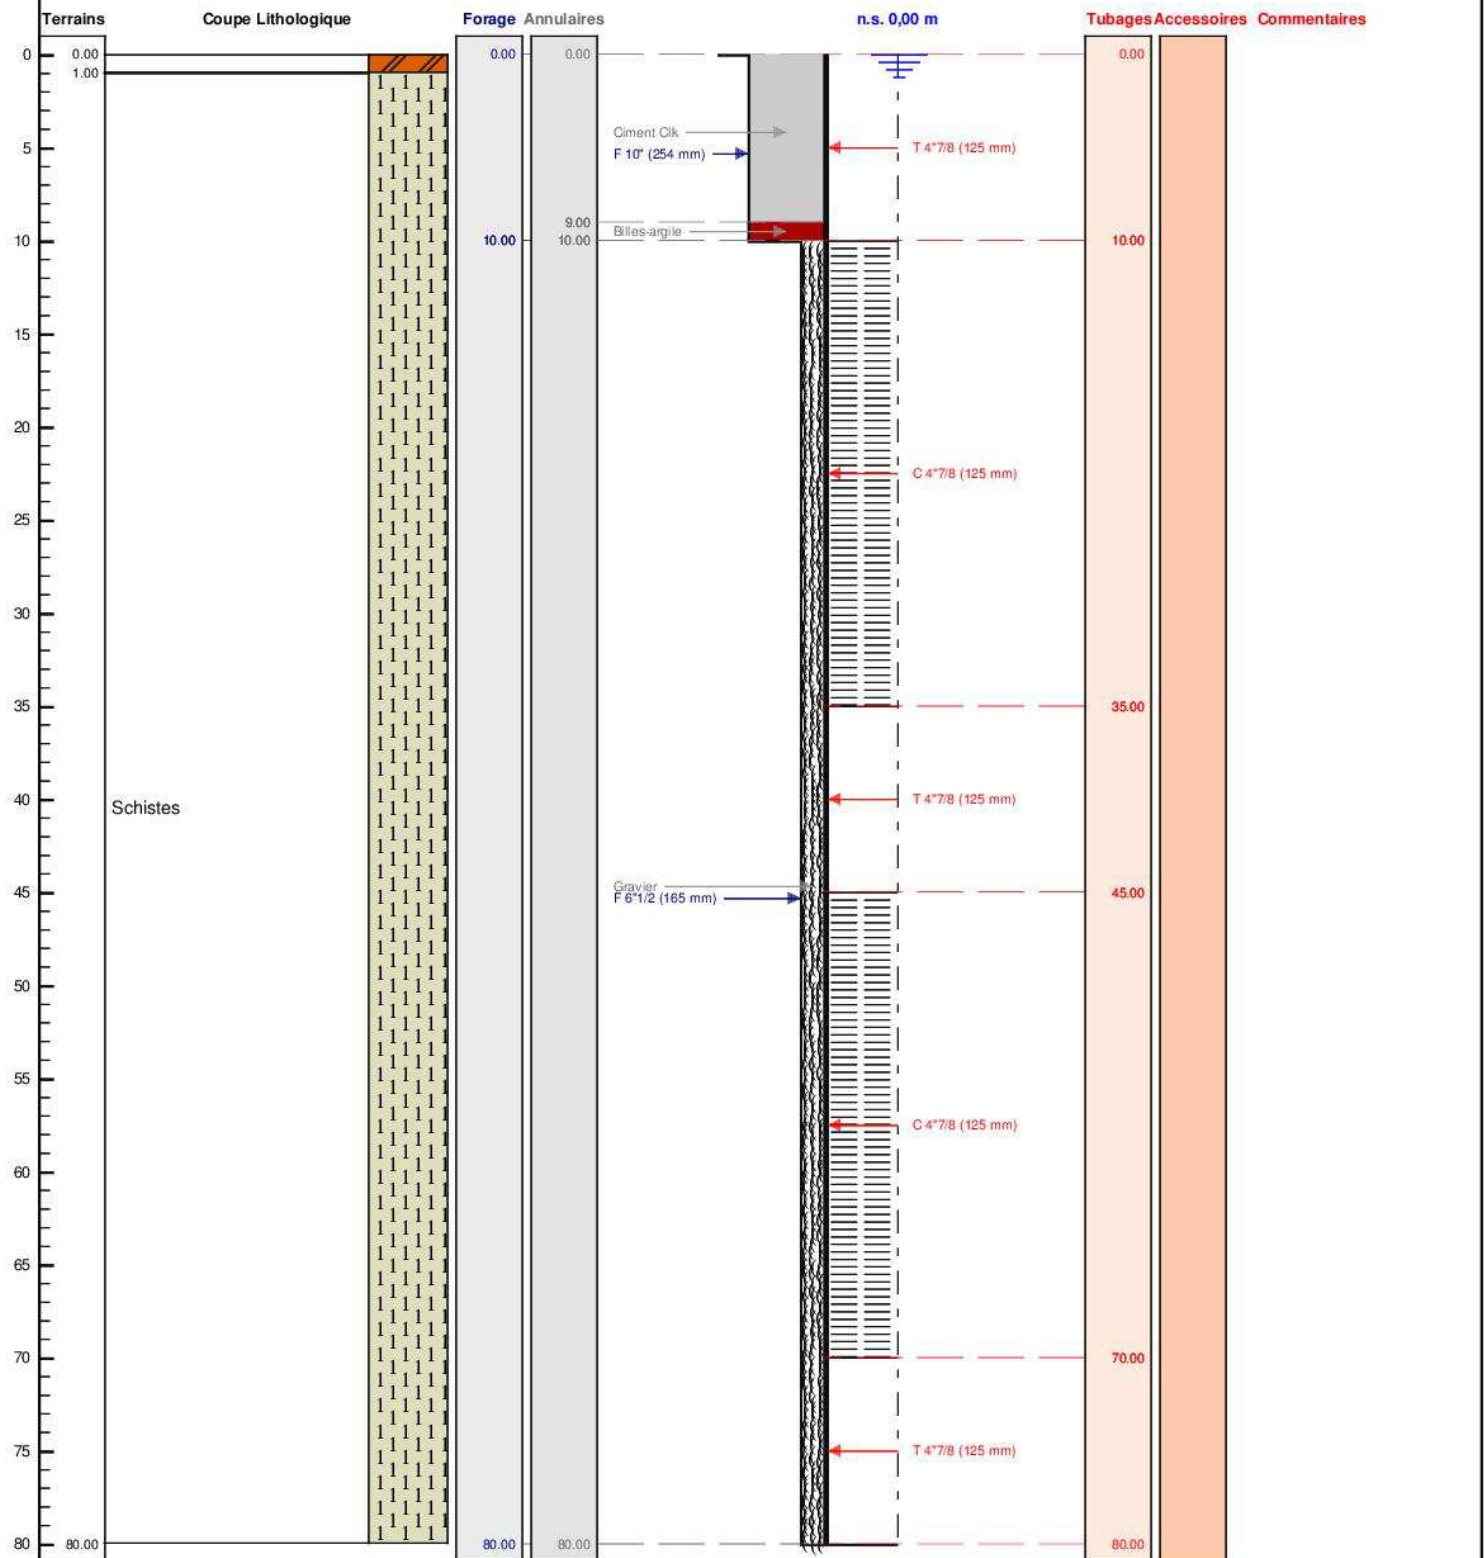

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
